N	Наименование на СМР	Механизация и оборудване	Отговорни експерти	Работници (вкл. технически съгрудници и общи работници)
		вид	вид	бр.
1	2	3	4	5
	ЕТАП ПРОЕКТИРАНЕ			
1	Съставяне на предварителни проектните решения	Преносими компютри и МПС	Главен проектант и проектанти по част технологична и земна основа	5
2	Предварително съгласуване с Възложителя на проектните решения и евентуални промени с оглед осигуряване на оптимални показатели за икономическа ефективност, архитектурни, конструктивни и инсталационни решения		Главен проектант, проектанти по част Технологична, Архитектура, Конструктивна, Земна основа, ВиК и Електро	8
3	Съставяне на проектна разработка по част Архитектура	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Архитект	3
4	Съставяне на проектна разработка по част Конструктивна;	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Проектант част „Конструктивна";	4
5	Съставяне на проектна разработка по част Геодезия	Преносими компютри, МПС, тотална станция, GPS и разпечатваща техника	Проектант по част Геодезия	2
6	Съставяне на проектна разработка по част Вертикална планировка и трасировъчен план	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Проектант по част Вертикална планировка и Трасировъчен план	2
7	Съставяне на проекта разработка по част Инженерна геология и хидрогеология	Преносими компютри, Моторна сонда, лабораторно оборудване, пенетрометър, геофизична станция МПС и разпечатваща техника	Проектант по част Инженерна геология и хидрогеология	3
8	Съставяне на проекта разработка по част Земна основа	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Проектант по част Земна основа	2
9	Съставяне на проектна разработка по част ЕЛ - силнотокови и слаботокови инсталации;	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Проектант част „Електро"	2
10	Съставяне на проектна разработка по част ВиК - вътрешни инсталации и площадкови канализации	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Проектант част „ВиК"	2
11	Съставяне на проектна разработка по част Технологична	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Проектант част „Технологична"	4
12	Съставяне на проектна разработка по част Паркоустройство и благоустройство	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Проектант част „Паркоустройство и благоустройство"	2
13	Съставяне на проектна разработка по част Пътна (вкл. ПОД и ВОД)	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Проектант по част Пътна	2
14	Съставяне на проектна разработка по част План за безопасност и здраве	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Проектант част „План за безопасност и здраве"	1
15	Съставяне на проектна разработка по част Проект за пожарна безопасност;	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Проектант част „Пожарна безопасност"	1
16	Съставяне на проектна разработка по част Подробна количествено-стойностна сметка по отделни части и общо за проекта	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Пълния проектантски екип	15
17	Съставяне на проектна разработка по част План за управление на строителните отпадъци	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Проектант част „План за управление на строителните отпадъци"	1
18	Проверка за съгласуваност между проектните части и отстраняване на несъответствия	Преносими компютри	Пълния проектантски екип	20
19	Окомплектоване на проектните разработки и предаване на Възложителя	Преносими компютри, МПС и разпечатваща техника	Пълния проектантски екип	22
	ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР			
2	**Изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР), включващи следните дейности:**		Ръководител екип, Технически ръководител, Координатор по Безопасност и Здраве и Експерт Контрол на Качеството	
2.1	Подготовка на площадката (вкл. почистване на терена от храсти и др. растителност, както и натоварване и транспорт на същите; изграждане и оборудване на строително-ситуационна площадка и др.)	Багер, Самосвали, Мобилен кран, Лекотоварни МПС и ръчни инструменти и пособия		15
2.2	Подготовка на земната основа (вкл. масов изкоп за оформяне на площадки, натоварване и превоз на з.м. и транспорт до депо; доставка и полагане на каменна фракция за оформяне на площадки и др.)	Багер, Самосвали, Лекотоварни МПС, Тежък валяк, Ръчни трамбовки и ръчни инструменти и пособия		22
2.3	Укрепителни конструкции	Багер, бетоновоз, бетонпомпа, кофражни пана, Мобилен кран, Пилотна машина, Анкерна машина, Лекотоварни МПС и ръчни инструменти и пособия		18
2.4	Настилки (вкл. доставка и полагане на трошенокаменна настилка за противозамръзващ пласт; доставка и полагане на добавки за заздравителен пласт; доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5 cm и др.)	Багер, Самосвали, Бетоновози, бетон помпа, Мобилен кран, Асфалтополагач, Тежък валяк, ръчна трамбовка, Лекотоварни МПС и ръчни инструменти и пособия		25
2.5	Електрическа инфраструктура	Лекотоварни МПС, Ръчни пособия и инструменти		8
2.6	Отводняване и оборотно оросяване (вкл. оформящ изкоп и земни почви с дълбочина 0,5 до 1,0 m; превоз на изъети земни маси; доставка и полагане на среден пясък за оформяне подложка на отводнителни окопи; доставка и монтаж на ст.б. трапецовидни корита и др.)	Багер, Самосвал, машина за спъртаване на тръби, Мобилен кран, Лекотоварни МПС и ръчни пособия и инструменти		10
3	Довършителни работи	Багер, Самосвали, Мобилен кран, Лекотоварни МПС и ръчни инструменти и пособия		10
4	**Осъществяване на авторски надзор**	Преносими компютри и МПС	Проектанти според съответния етап на строителство и засегната част от проекта	5
				Брой части работна ръка

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО ПРОЕКТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ

I Месец | II Месец

ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТА, СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЙТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И АВТОРСКИ НАДЗОР

I Месец	II Месец	III Месец	IV месец	V месец	VI месец	VII месец	VIII месец	IX месец	X месец	XI месец
30 дни	30 дни	30 дни	30 дни	30 дни	30 дни	30 дни	30 дни	30 дни	30 дни	30 дни
20	20	27	27	23	23	30	30	30	30	33

чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а, ал.3 от ЗОП

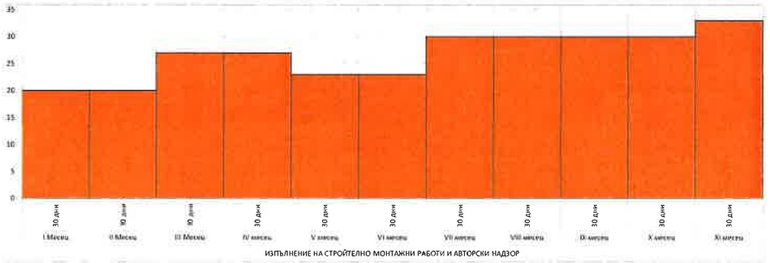

976
